

**PANORAMA DE OBRAS  
CAIXA  
ORIENTAÇÕES DE USO**

**CAIXA**

# SUMÁRIO

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| INTRODUÇÃO                        | 3  |
| FUNCIONALIDADES PADRÕES DO PAINEL | 4  |
| PANORAMA DE OBRAS                 | 8  |
| SUGESTÕES DE INSIGHTS             | 18 |

# 01 INTRODUÇÃO

**Objetivo:** Este manual tem como objetivo orientar os usuários na utilização eficiente do painel "**Panorama de Obras Caixa**", que oferece uma visão consolidada e estratégica da carteira de obras sob gestão. Através deste guia, busca-se:

1. **Facilitar a compreensão das funcionalidades do painel**, explicando a estrutura, os filtros disponíveis, os indicadores-chave e os gráficos interativos.
2. **Apoiar a tomada de decisão**, fornecendo instruções claras sobre como interpretar os dados apresentados, identificar gargalos, acompanhar o progresso físico e financeiro das obras e antecipar possíveis desvios.
3. **Promover a padronização do uso**, garantindo que todos os membros da equipe utilizem o painel de forma alinhada, extraindo informações de maneira consistente e confiável.
4. **Estimular a proatividade na gestão**, ao permitir que os usuários monitorem em tempo real os principais indicadores de desempenho, prazos, custos e status das obras, favorecendo ações corretivas tempestivas.
5. **Servir como referência para treinamentos e integração de novos colaboradores**, contribuindo para a disseminação do conhecimento e o fortalecimento da cultura de dados na equipe.

# 02 FUNCIONALIDADES PADRÕES DO PAINEL

## - Filtro simples

Permite que o usuário clique em um elemento de um visual (como uma barra, ponto de gráfico, linha de tabela) para filtrar automaticamente os demais visuais da página com base nessa seleção.

Como funciona?

1. Clique em um dado: por exemplo, em um determinado município da sua unidade.
2. Filtragem automática: todos os outros visuais da página (como tabelas, cartões ou outros gráficos) são atualizados para mostrar apenas os dados relacionados àquele município.
3. Interação contextual: isso permite uma análise mais rápida e intuitiva, sem a necessidade de aplicar filtros manualmente.

## - Filtros Múltiplos

Permite que o usuário selecione mais de um dado dentro do painel (como por exemplo, selecionar o município (Caruaru) e o ministério gestor (FNDE)), permitindo aplicar filtros combinados nos demais visuais da página.

Como funciona?

1. Clique com Ctrl (ou Shift): segure a tecla Ctrl (ou Shift) e clique em vários elementos de um visual.
2. O Painel aplica um filtro combinado com todos os valores selecionados.

3. Os demais visuais da página são atualizados para mostrar apenas os dados relacionados às seleções feitas.

Exemplo prático:

Imagine um gráfico de barras com vendas por estado. Se você clicar em Pernambuco e depois, segurando Ctrl, clicar em Bahia e Ceará, os demais visuais (como tabelas ou cartões) mostrarão apenas os dados desses três estados.

### - Desabilitar filtros


Permite retirar totalmente ou parcialmente os filtros selecionados.

Exemplo prático: Temos um gráfico com a quantidade de obras por estado do Brasil. Selecionamos os filtros para os estados de PB, PE e CE. Como refazemos o filtro e desabilitamos apenas o estado do CE?

1. Clique no gráfico onde os estados estão filtrados (por exemplo, um gráfico de barras com os estados).
2. Você verá que PB, PE e CE estão selecionados (geralmente destacados ou com cor diferente).
3. Para remover apenas CE, segure a tecla Ctrl no teclado.
4. Clique sobre o estado de CE no gráfico.
  - Isso desmarca CE, mantendo apenas PB e PE selecionados.
5. Os demais visuais da página serão atualizados automaticamente com base apenas nos estados PB e PE.

### - Ordenação em tabelas

Permite ao usuário organizar os dados exibidos em uma tabela com base em uma coluna, em ordem crescente ou decrescente.

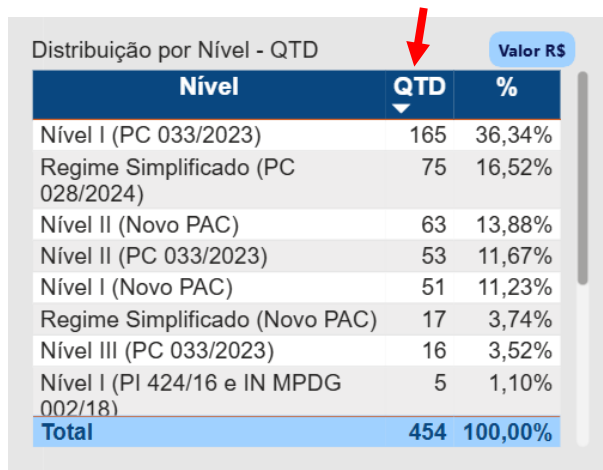

Distribuição por Nível - QTD Valor R\$

| Nível                                | QTD        | %              |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| Nível I (PC 033/2023)                | 165        | 36,34%         |
| Regime Simplificado (PC 028/2024)    | 75         | 16,52%         |
| Nível II (Novo PAC)                  | 63         | 13,88%         |
| Nível II (PC 033/2023)               | 53         | 11,67%         |
| Nível I (Novo PAC)                   | 51         | 11,23%         |
| Regime Simplificado (Novo PAC)       | 17         | 3,74%          |
| Nível III (PC 033/2023)              | 16         | 3,52%          |
| Nível I (PI 424/16 e IN MPDG 002/18) | 5          | 1,10%          |
| <b>Total</b>                         | <b>454</b> | <b>100,00%</b> |

**1 - Clique na coluna que deseja ter como referência.**

**2 - A seta branca indica a coluna de referência para ordenação e o tipo de ordenação (crescente ou decrescente).**

### - Modo de foco

Permite ampliar visualmente um gráfico ou visual específico dentro de um dashboard, destacando-o em tela cheia para facilitar a análise detalhada.



Modo de foco

|    | Nível                  | Engenharia atual | Operacional atual | Gestor   |
|----|------------------------|------------------|-------------------|----------|
| la | Nível I (Novo PAC)     | DENNISE MELO     | JOSE ROBERVAN     | MCIDADES |
| la | Nível VI (PC 033/2023) | GUSTAVO MUNIZ    | SANDRA PAULA      | MAP      |

**1 - Clique no botão intermediário (Modo de foco)**

Irá abrir uma janela com o visual ampliado. Para retornar ao relatório geral, clicar no botão "Voltar ao relatório".



### - Exportar dados

Permite que o usuário extraia os dados de um visual (como tabelas ou gráficos) para análise externa, geralmente em formatos como Excel (.xlsx) ou CSV(.csv).

Relação das obras

| Operação | Convênio | Município | Objeto                                                                                                                                                                                                               | R\$              | Sit. obra    | Nível                 | Engenharia atual | Operacional atual | Gestor |
|----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------|
| 1079851  | 918676   | ARCOVERDE | reforma de edificação de uso público com aquisição de equipamentos para implantação da galeria de arte de arcoverde, localizada no município de arcoverde/pe.                                                        | 388.038,05       | Não iniciada | Nível I (PC 033/2023) | GUSTAVO MUNIZ    | ELBENIZ BARBOSA   | MINC   |
| 1080551  | 917962   | ARCOVERDE | estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social - suas - construção de centro de referencia de assistência social - cras e unidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes | 1.986.212,14     | Não iniciada | Nível I (PC 033/2023) | GUSTAVO MUNIZ    | ELBENIZ BARBOSA   | MINC   |
| Total    |          |           |                                                                                                                                                                                                                      | 1.280.897.346,46 |              |                       |                  |                   |        |

1 - Clique no botão com 3 pontinhos



# 03 PANORAMA DE OBRAS

**Link de acesso:** <http://www.gigovca.pe.caixa/panoramadeobras/>

## Estrutura do painel

Selecionar a unidade

Data de atualização dos dados

Dados gerais



Apresenta os principais dados e indicadores da carteira

Ciclo de vida



Apresenta as fases da obra, desde planejamento inicial até a finalização

Suspensivas

A screenshot of the 'Suspensivas' dashboard. It displays a table with columns for 'Unidade', 'Valor', 'Porcentagem', and 'Status'. The table is highlighted with a yellow border. The background of the dashboard is light yellow.

Apresenta o estado atual das Suspensivas


Execução e obras paralisadas

A screenshot of the 'Execução e obras paralisadas' dashboard. It features a table with columns for 'Unidade', 'Valor', 'Porcentagem', and 'Status'. The table is highlighted with a red border. Below the table, there are two summary cards with values 40 and 20. The background of the dashboard is light red.

Apresenta a visão geral da execução (ritmo de obra, % executada, obras paralisadas etc.)

### Escolha da unidade:

**Escolha a unidade**

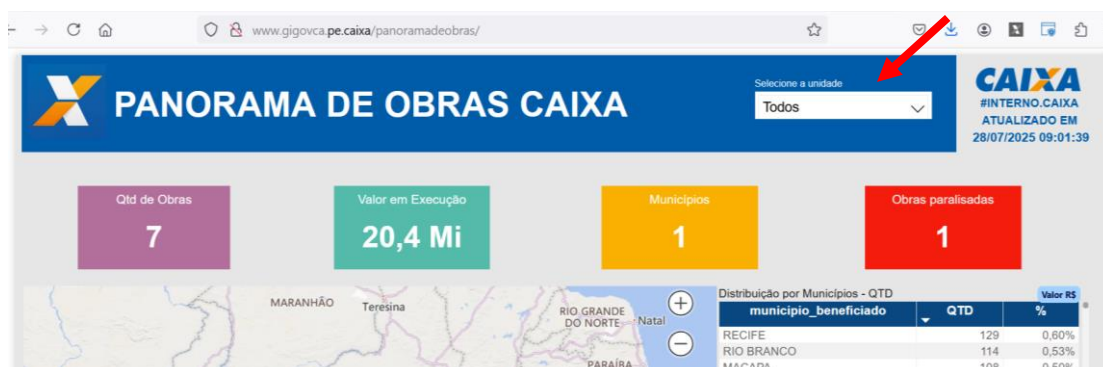

A nomenclatura "Todos" reflete as informações de todas as unidades (GIGOV e REGOV).

Caso esteja marcada alguma unidade específica e queira retornar a "Todos", basta desmarcar todas as unidades.



**Ao selecionar a unidade, todo o painel será adaptado com as informações da unidade.**

É possível selecionar mais de uma unidade. Clique na 1ª unidade e com a tecla "Ctrl" apertada, selecione outras unidades.

### Seção Indicadores



Nesta seção, tem-se os principais quantitativos da(s) unidade(s) selecionada(s), como: quantidade de obras, valor em execução, municípios atendidos e obras paralisadas.



### Seção Município

Mostra os municípios abrangidos pela unidade selecionada em formato de tabela.

| Município              | QTD        | %              |
|------------------------|------------|----------------|
| VITORIA DE SANTO ANTAO | 17         | 3,74%          |
| CARUARU                | 14         | 3,08%          |
| TIMBAUBA               | 14         | 3,08%          |
| GRAVATA                | 11         | 2,42%          |
| GARANHUNS              | 10         | 2,20%          |
| ARCOVERDE              | 9          | 1,98%          |
| BEZERROS               | 9          | 1,98%          |
| BOM CONSELHO           | 9          | 1,98%          |
| PAUDALHO               | 9          | 1,98%          |
| SIRINHAEM              | 9          | 1,98%          |
| BELO JARDIM            | 8          | 1,76%          |
| BOM JARDIM             | 8          | 1,76%          |
| BONITO                 | 8          | 1,76%          |
| JOAO ALFREDO           | 8          | 1,76%          |
| <b>Total</b>           | <b>455</b> | <b>100,00%</b> |

| Município                | R\$                     | %              |
|--------------------------|-------------------------|----------------|
| CARUARU                  | 108.958.520,28          | 8,51%          |
| VITORIA DE SANTO ANTAO   | 62.965.009,64           | 4,92%          |
| LIMOEIRO                 | 55.188.512,89           | 4,31%          |
| BELO JARDIM              | 42.811.772,08           | 3,34%          |
| PALMARES                 | 37.188.130,07           | 2,90%          |
| GARANHUNS                | 32.474.345,10           | 2,54%          |
| BOM JARDIM               | 30.524.717,75           | 2,38%          |
| BOM CONSELHO             | 29.197.435,02           | 2,28%          |
| JOAO ALFREDO             | 29.101.750,88           | 2,27%          |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 26.981.529,86           | 2,11%          |
| TIMBAUBA                 | 23.825.145,20           | 1,86%          |
| BEZERROS                 | 23.504.302,92           | 1,83%          |
| PAUDALHO                 | 23.362.405,21           | 1,82%          |
| SIRINHAEM                | 22.773.442,89           | 1,78%          |
| <b>Total</b>             | <b>1.280.897.346,46</b> | <b>100,00%</b> |

01 – É possível alterar o visual da tabela entre quantidade de obras e valores de execução. Clique no botão (01) para alternar.

02 – A seta branca indica a coluna de referência para ordenação e o tipo de ordenação (crescente ou decrescente).

### Seção Unidade, Eng./Arq. e Operacional

Mostra as informações de quantidade de obras e valores de execução por unidade/coordenação, Eng./Arq. e operacionais abrangidos pela unidade selecionada em formato de tabela.

| Unidade      | QTD        | %              |
|--------------|------------|----------------|
| GIGOV/CA     | 455        | 100,00%        |
| <b>Total</b> | <b>455</b> | <b>100,00%</b> |

| Eng/Arq atual              | QTD        | %              |
|----------------------------|------------|----------------|
| NATALI DA SILVA NASCIMENTO | 69         | 15,20%         |
| ANTONIO LEOMAR             | 66         | 14,54%         |
| ITAJACY LIRA               | 63         | 13,88%         |
| PRICYLLA GIRÃO             | 54         | 11,89%         |
| <b>Total</b>               | <b>454</b> | <b>100,00%</b> |

| Operacional atual   | QTD        | %              |
|---------------------|------------|----------------|
| CIDCLEI DE OLIVEIRA | 75         | 16,52%         |
| ELBENIZ BARBOSA     | 74         | 16,30%         |
| EMANUEL RODRIGUES   | 72         | 15,86%         |
| ALAILZA BALBINA     | 67         | 14,76%         |
| JOSE ROBERVAN       | 62         | 13,66%         |
| <b>Total</b>        | <b>454</b> | <b>100,00%</b> |

| Unidade                                      | QTD        | %              |
|----------------------------------------------|------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> GIGOV/CA | 455        | 100,00%        |
| Coordenação - Mata/Agreste                   | 255        | 56,04%         |
| Coordenação - Agreste/Sertão                 | 199        | 43,74%         |
| <b>Total</b>                                 | <b>455</b> | <b>100,00%</b> |

**Clicando na caixa de agrupamento, pode-se segmentar as informações por coordenação.**

### Seção Ministérios gestores

Mostra as informações de quantidade de obras e valores de execução por ministério gestor


Distribuição por Gestor - QTD Valor R\$

| Gestor       | QTD        | %              |
|--------------|------------|----------------|
| MCIDADES     | 199        | 43,74%         |
| FNDE         | 80         | 17,58%         |
| MTUR         | 48         | 10,55%         |
| MESP         | 47         | 10,33%         |
| MIDR         | 35         | 7,69%          |
| MS           | 19         | 4,18%          |
| MAP          | 17         | 3,74%          |
| MDASCF       | 9          | 1,98%          |
| MINC         | 1          | 0,22%          |
| <b>Total</b> | <b>455</b> | <b>100,00%</b> |

### Seção Situação das Obras

Mostra as informações da situação das obras (não iniciada, normal, paralisada, obra física concluída, atrasada, obra frustrada, adiantada etc.).

Clique na situação desejada e o painel será adaptado para esse estado.

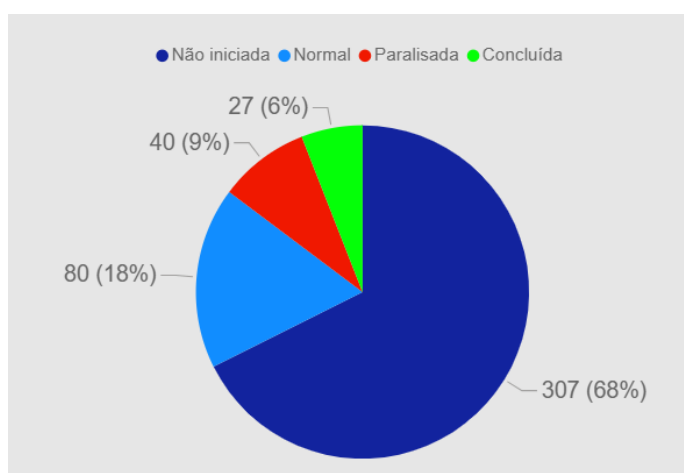

### Seção Nível

Mostra as informações de quantidade de obras e valores de execução por nível de obra (nível I, nível II, nível III, regime simplificado etc.).

Distribuição por Nível - QTD Valor RS

| Nível                                | QTD        | %              |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| Nível I (PC 033/2023)                | 165        | 36,34%         |
| Regime Simplificado (PC 028/2024)    | 75         | 16,52%         |
| Nível II (Novo PAC)                  | 63         | 13,88%         |
| Nível II (PC 033/2023)               | 53         | 11,67%         |
| Nível I (Novo PAC)                   | 51         | 11,23%         |
| Regime Simplificado (Novo PAC)       | 17         | 3,74%          |
| Nível III (PC 033/2023)              | 16         | 3,52%          |
| Nível I (PI 424/16 e IN MPDG 002/18) | 5          | 1,10%          |
| <b>Total</b>                         | <b>454</b> | <b>100,00%</b> |

### Seção Relação das obras

Mostra as principais informações da obra, como número da operação, número do convênio, nome do objeto, valor de execução, situação da obra, nível de contratação, nome do Eng./Arq. responsável, operacional responsável e ministério gestor.

| Operação                | Convênio               | Município | Objeto                                                                                                               | R\$                     | Sit. obra    | Nível                 | Engenharia atual | Operacional atual | Gestor   |
|-------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------|
| <a href="#">1007076</a> | <a href="#">788633</a> | ABRESTINA | reforma de campo de futebol                                                                                          | 341.862,86              | Paralisada   | Nível I (PC 033/2023) | ROSALI NUNES     | ELBENIZ BARBOSA   | MESP     |
| <a href="#">1037801</a> | <a href="#">843545</a> | ABRESTINA | reforma e ampliação do campo de futebol, no município de agrestina - pe.                                             | 859.910,47              | Paralisada   | Nível I (PC 033/2023) | ROSALI NUNES     | ELBENIZ BARBOSA   | MESP     |
| <a href="#">1074918</a> | <a href="#">909293</a> | ABRESTINA | pavimentação em paralelepípedos, em áreas rurais, do acesso a vila de barra do jardim, no município de agrestina pe. | 593.105,96              | Normal       | Nível I (PC 033/2023) | ROSALI NUNES     | ELBENIZ BARBOSA   | MIDR     |
| <a href="#">1087703</a> | <a href="#">943695</a> | ABRESTINA | pavimentação de vias públicas no município                                                                           | 520.596,81              | Não iniciada | Nível I (PC           | ROSALI NUNES     | ELBENIZ           | MCIDADES |
| <b>Total</b>            |                        |           |                                                                                                                      | <b>1.280.897.346,46</b> |              |                       |                  |                   |          |

**Ao clicar no número da operação, você será redirecionado para a página correspondente no REUNI.**

**Ao clicar no número do convênio, você será redirecionado para a página correspondente no TGOV.**

| Relação das obras |          |           |                                                                                                                      | Situação atual          |              |                       | Operaria atual | Operacional atual | Gestor   |
|-------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------|
| Operação          | Convênio | Município | Objeto                                                                                                               |                         |              |                       |                |                   |          |
| 1007076           | 788633   | AGRESTINA | reforma de campo de futebol                                                                                          |                         |              |                       | NUNES          | ELBENIZ BARBOSA   | MESP     |
| 1037801           | 843545   | AGRESTINA | reforma e ampliação do campo de futebol, no município de agrestina - pe.                                             | 859.910,47              | Paralisada   | Nível I (PC 033/2023) | ROSALI NUNES   | ELBENIZ BARBOSA   | MESP     |
| 1074918           | 909293   | AGRESTINA | pavimentação em paralelepípedos, em áreas rurais, do acesso a vila de barra do jardim, no município de agrestina pe. | 593.105,96              | Normal       | Nível I (PC 033/2023) | ROSALI NUNES   | ELBENIZ BARBOSA   | MIDR     |
| 1087703           | 943695   | AGRESTINA | pavimentação de vias públicas no município                                                                           | 520.596,81              | Não iniciada | Nível I (PC           | ROSALI NUNES   | ELBENIZ BARBOSA   | MCIDADES |
| <b>Total</b>      |          |           |                                                                                                                      | <b>1.280.897.346,46</b> |              |                       |                |                   |          |

**Ao posicionar o cursor sobre uma linha da tabela, será exibida uma caixa suspensa com a situação atual do objeto.**

## Seção Ciclo de vida das obras

Permite uma visão clara, integrada e dinâmica do ciclo de vida das obras, desde o planejamento inicial até a finalização. Ele está estruturado em seis fases principais: Plano de Trabalho, Projeto, VRPL, AIO, Execução e PCF.


Cada fase é representada por cards interativos, que exibem a quantidade de obras em cada subetapa, com base nas etiquetas principais do REUNI. Isso permite um acompanhamento detalhado e em tempo real do andamento dos processos.



**Clique no card desejado para filtrar as obras correspondentes. Ex.: Para saber as obras em fase de VRPL, clicar no card "Análise técnica concluída".**

### Seção Suspensivas

Permite uma visão geral das condições de suspensiva.

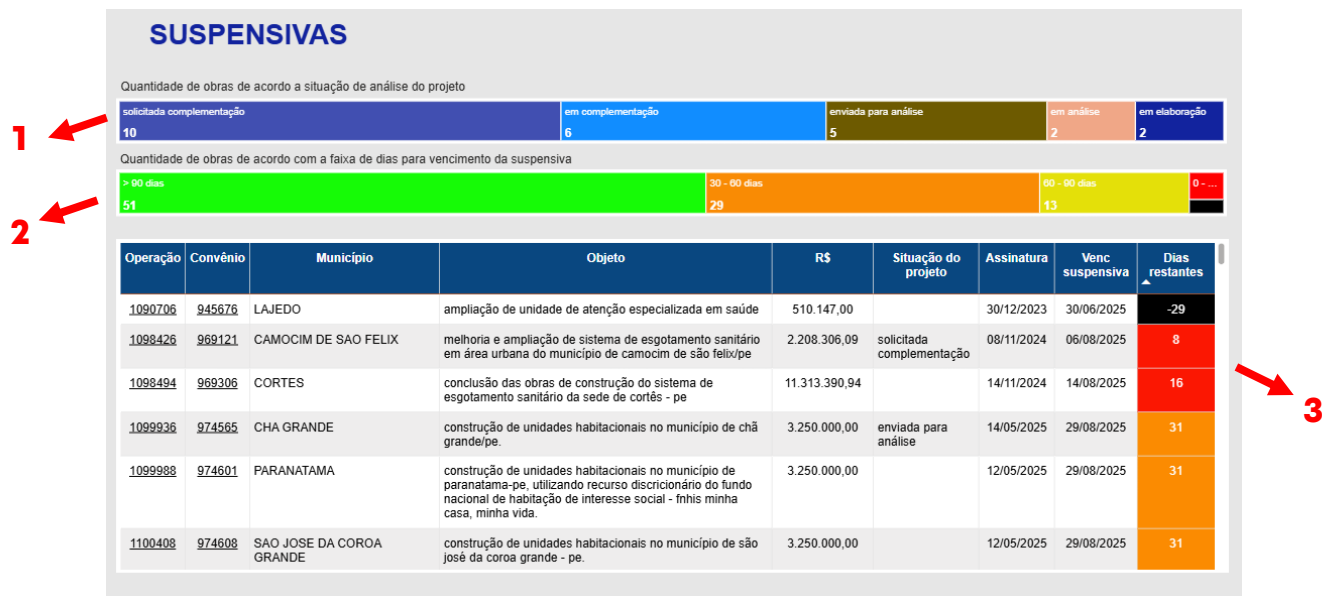

1- Barra com a quantidade de obras de acordo com a situação do projeto (solicitada complementação, em complementação etc.). Clique na situação desejada para filtrar o painel.

2 – Barra com a quantidade de obras de acordo com a faixa de dias para vencimento da suspensiva (Expirado, 0-30 dias, 30-60 dias, 60-90 dias e >90 dias).

3 – Coluna da tabela que mostra os dias restantes para o vencimento da suspensiva. As cores alertam para a urgência de atuação.

### Seção Acompanhamento da execução

Permite uma visão geral das condições da execução das obras (% executada, ritmo de obra, projeção de conclusão, marcos de vistoria etc.).

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO**

% de obras de acordo com a faixa de execução informada:

|                |                |                |                  |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 0 - 25%<br>74% | 25 - 50%<br>5% | 50 - 75%<br>6% | 75 - 100%<br>16% |
|----------------|----------------|----------------|------------------|

| Operação | Convênio | Município            | Objeto                                                                                                                                                 | R\$          | Sit. Obra  | % Informada | % Executada | Data última evolução considerada | Ritmo de obra (%/mês) | Projeção de Data de Conclusão | Marcos de vistoria                                                                                                             |                                                                                                                                |
|----------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1071321  | 900824   | PAUDALHO             | ações de infraestrutura urbana - serviços de pavimentação nova em asfáltico e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do município de paudalho/pe. | 4.094.758,49 | Normal     | ● 94,19     | 94,19       | 23/05/2025                       | <b>2</b>              | 01/08/2025                    | <input checked="" type="checkbox"/> 33%<br><input checked="" type="checkbox"/> 66%<br><input checked="" type="checkbox"/> 100% |                                                                                                                                |
| 1043339  | 849051   | FEIRA NOVA           | ações de infraestrutura urbana: serviços de pavimentação por calçamento em paralelepípedo, em diversas ruas do município de feira nova/pe.             | 1.008.236,97 | Normal     | ● 93,33     | 62,07       | 06/05/2025                       | 1,12                  | 31/10/2025                    | <b>3</b>                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 30%<br><input checked="" type="checkbox"/> 60%<br><input checked="" type="checkbox"/> 100% |
| 1041924  | 846422   | SÃO JOAQUIM DO MONTE | implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município de são joaquim do monte/pe.                                               | 307.838,52   | Paralisada | ● 92,04     | 79,09       | 14/03/2025                       | 1,64                  | 06/08/2025                    | <b>4</b>                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 50%<br><input checked="" type="checkbox"/> 60%<br><input checked="" type="checkbox"/> 100% |

Obs.1: Os convênios marcados com "círculo verde" na coluna "% Informada" sugerem gestão para encerramento do objeto

Obs.2: A coluna "Marcos de vistoria" informa a quantidade e a condição das vistorias (  vistoria liberada para realização ou  vistoria não liberada). Para alguns convênios, a distribuição dos valores dos marcos foi estabelecida visando uma maior uniformidade entre as vistorias.

1 – Barra com a quantidade em % das obras correspondentes as faixas estabelecidas (0-25%, 25-50%, 50-75% e 75-100%).

2 – Coluna ritmo de execução: É calculada através da relação da % informada e o tempo entre a data do AIO e a data da última evolução considerada. A unidade de medida é %/mês.

3 – Coluna Projeção de data de conclusão: É calculada através da data da última evolução considerada acrescida do ritmo de obra.

4 – Coluna marcos de vistoria: Mostra os marcos de vistoria de acordo com o nível de contratação (nível I, II, III, simplificado etc.). Os marcos com "check" verde indicam vistoria liberada para realizar. Os marcos com o símbolo "X" vermelho indicam vistoria não liberada.

5 – Os convênios com marcação com círculo verde na coluna "% Informada" indicam obra com execução maior que 90%, sugerindo uma gestão para encerramento da carteira.

## Seção Obras Paralisadas

Permite uma visão geral das obras paralisadas e irão paralisar nos próximos 30 dias.



1 – Marcador da quantidade de obras paralisadas (mais de 90 dias sem registro de medição).

2 – Marcador da quantidade de obra a paralisar (mais de 60 dias sem registro de medição).

3 – Coluna com a quantidade de dias sem evolução. As cores alertam para a condição das obras.

# 04 SUGESTÕES DE INSIGHTS

## Reunião com o Tomador

Distribuição por Municípios - Valor

| Município                | R\$                     | %              |
|--------------------------|-------------------------|----------------|
| CARUARU                  | 108.958.520,28          | 8,51%          |
| VITORIA DE SANTO ANTAO   | 62.965.009,64           | 4,92%          |
| LIMOEIRO                 | 55.188.512,89           | 4,31%          |
| BELO JARDIM              | 42.811.772,08           | 3,34%          |
| PALMARES                 | 37.188.130,07           | 2,90%          |
| GARANHUNS                | 32.474.345,10           | 2,54%          |
| BOM JARDIM               | 30.524.717,75           | 2,38%          |
| BOM CONSELHO             | 29.197.435,02           | 2,28%          |
| JOAO ALFREDO             | 29.101.750,88           | 2,27%          |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 26.981.529,86           | 2,11%          |
| TIMBAUBA                 | 23.825.145,20           | 1,86%          |
| BEZERROS                 | 23.504.302,92           | 1,83%          |
| PAUDALHO                 | 23.362.405,21           | 1,82%          |
| SIRINHAEM                | 22.773.442,89           | 1,78%          |
| <b>Total</b>             | <b>1.280.897.346,46</b> | <b>100,00%</b> |

**Clique sobre o município desejado para filtrar e atualizar automaticamente todas as informações do painel, exibindo dados específicos como obras paralisadas, projetos pendentes, obras próximas da conclusão, entre outros.**

O Panorama de Obras pode auxiliar como uma ferramenta estratégica nas reuniões com representantes municipais. Ele permite uma visualização consolidada e filtrável de todas as obras em andamento, organizadas por fase, status e principais marcos do ciclo de vida.

A funcionalidade de filtragem por município é um diferencial que agiliza a preparação das pautas, permitindo que a equipe técnica acesse rapidamente as informações específicas de cada localidade. Com isso, é possível:

- Identificar gargalos e pendências em tempo real;
- Apresentar dados objetivos e atualizados durante a reunião;
- Facilitar a tomada de decisão com base em evidências;
- Promover um diálogo mais produtivo e direcionado com os gestores locais.

### Possibilidade de encerramento utilizando fruição ou redução de meta para obras paralisadas com evolução avançada

- Usaremos o conceito de filtragem múltipla

#### 1 - Selecione o responsável (coordenação e/ou Eng./Arq.)


Distribuição por Unidade - QTD Valor R\$

| Unidade                      | QTD | %       |
|------------------------------|-----|---------|
| GIGOV/CA                     | 455 | 100,00% |
| Coordenação - Mata/Agreste   | 255 | 56,04%  |
| Coordenação - Agreste/Sertão | 199 | 43,74%  |
| Total                        | 455 | 100,00% |


Eng/Arq GOV - QTD Valor R\$

| Eng/Arq atual              | QTD | %       |
|----------------------------|-----|---------|
| NATALI DA SILVA NASCIMENTO | 69  | 15,20%  |
| ANTONIO LEOMAR             | 66  | 14,54%  |
| ITAJACY LIRA               | 63  | 13,88%  |
| PRICYLLA GIRÃO             | 54  | 11,89%  |
| Total                      | 454 | 100,00% |

#### 2 - Selecione a situação da obra paralisada

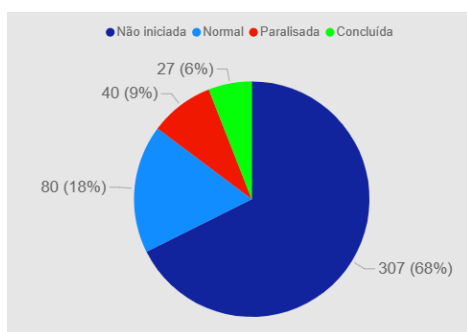

#### 3 - Selecione a faixa de execução (75 - 100%)



#### 4 - Verificar quais as obras nessa situação

| Operação | Convênio | Município  | Objeto                                             | R\$          | Dias sem evolução |
|----------|----------|------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 1086127  | 939376   | AGUA PRETA | adequação das estradas vicinais.                   | 2.018.002,06 | 375               |
| 1089614  | 948169   | CATENDE    | recapeamento asfáltico no município de catende-pe. | 5.760.000,00 | 323               |

### Planejando vistorias de Eng./Arq GOV

1 - Selecione o responsável (Eng./Arq.)

| Eng/Arq GOV - QTD          |            | Valor R\$      |
|----------------------------|------------|----------------|
| Eng/Arq atual              | QTD        | %              |
| NATALI DA SILVA NASCIMENTO | 69         | 15,20%         |
| ANTONIO LEOMAR             | 66         | 14,54%         |
| ITAJACY LIRA               | 63         | 13,88%         |
| PRICYLLA GIRÃO             | 54         | 11,89%         |
| <b>Total</b>               | <b>454</b> | <b>100,00%</b> |

2 - Verificar na tabela de Acompanhamento de execução o comparativo entre as colunas "%Informada" x "%Executada" x "Marcos de vistoria".

| % Informada | % Executada | Data última evolução considerada | Ritmo de obra (%/mês) | Projeção de Data de Conclusão | Marcos de vistoria                         |
|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 98,47       | 51,95       | 26/06/2025                       | 5,02                  | 05/07/2025                    | ✗ 100%                                     |
| 97,95       | 97,95       | 04/07/2025                       | 7,61                  | 12/07/2025                    | ✓ 20%<br>✓ 40%<br>✓ 60%<br>✓ 80%<br>✗ 100% |
| 97,43       | 55,06       | 27/01/2025                       | 8,57                  | 05/02/2025                    | ✗ 100%                                     |

**Verifica-se que as obras destacadas se encontram próximas de atingir o marco de vistoria.**

### Projetos não iniciados pelo Tomador

Verificar quais os convênios que ainda não incluíram documentos na plataforma Transferegov. Assim, buscar contato com o Tomador para evitar risco de cancelamento da operação.

1 – Verificar na tabela “Suspensivas” as colunas de Situação do projeto e Venc da suspensiva.

| Situação do projeto  | Assinatura | Venc suspensiva | Dias restantes |
|----------------------|------------|-----------------|----------------|
|                      | 14/11/2024 | 14/08/2025      | 16             |
| enviada para análise | 14/05/2025 | 29/08/2025      | 31             |
|                      | 12/05/2025 | 29/08/2025      | 31             |
|                      | 12/05/2025 | 29/08/2025      | 31             |
| enviada para análise | 09/05/2025 | 29/08/2025      | 31             |
|                      | 09/05/2025 | 29/08/2025      | 31             |

**Verifica-se que as obras destacadas se encontram com a situação de projeto “sem preenchimento” e data de vencimento da suspensiva próxima ao fim.**

### Obras com ritmo muito lento

Verificar quais os convênios estão com ritmo muito lento e que precisam atenção da gestão.

1 – Verificar na tabela “Acompanhamento de execução” a coluna de Ritmo de obra e projeção de data de conclusão.

| Ritmo de obra (%/mês) | Projeção de Data de Conclusão |
|-----------------------|-------------------------------|
| 0,15                  | 18/10/2080                    |

**Neste exemplo, verifica-se que a obra tem previsão de conclusão em 2080 se mantiver esse ritmo.**

### Evitando paralisação de obras

Identificar os convênios que estão a menos de 30 dias do prazo para classificação como paralisados.

1 – Verificar na tabela de Obras Paralisadas na seção de Acompanhamento de execução

| Objeto                                                                                     | R\$          | Dias sem evolução |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| pavimentação de vias públicas no perímetro urbano do município de poção/pe.                | 1.254.983,84 | 109               |
| adequação de estradas vicinais no município de chã grande/pe.                              | 7.198.782,77 | 106               |
| construção de quadra poliesportiva, no município de barreiros/pe.                          | 1.032.819,37 | 91                |
| obra de reabilitação e urbanização acessível de duas praças no município de canhotinho/pe. | 655.053,86   | 87                |
| construção de praça pública no município de brejo da madre de deus/pe                      | 3.197.363,84 | 87                |

**Neste exemplo, temos a obra com 87 dias sem registro de medição, ou seja, faltando 4 dias para paralisada. Contactar Tomador.**

**CAIXA**
